

付替林道 法面アンカー工事の進捗状況について

平成 22年 11月 22日
袋井土木事務所 ダム管理課

昨年7月30日に路面と法面の一部に変状が確認された付替林道の法面对策工事について、現在までの進捗状況をお知らせします。

今年度から着手していましたが、アンカーの設置を実施していきます。アンカー設置完了後は林道の舗装とガードレールの設置を行う予定です。


なお、工事中の法面点検や変位観測において、付替林道の安全性に影響を及ぼすような変位は確認されていません。

工事概要


- グランドアンカー工
- ガードレール工
- 林道舗装工

以上の対策について、右の図面のとおりの工事を実施していきます。

計画横断面図

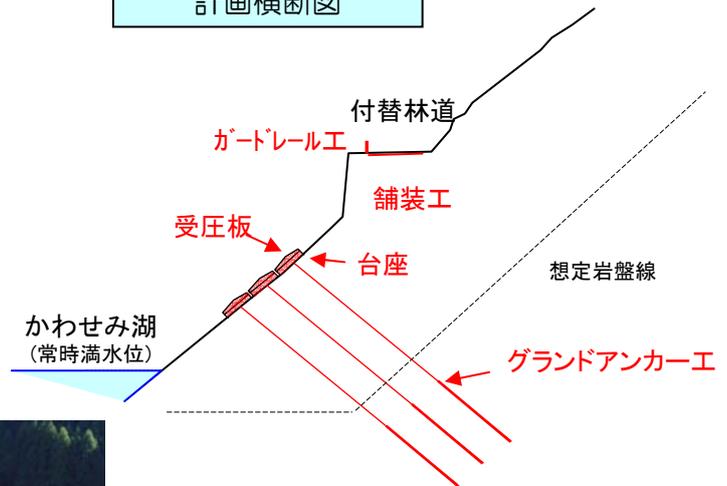

状況写真

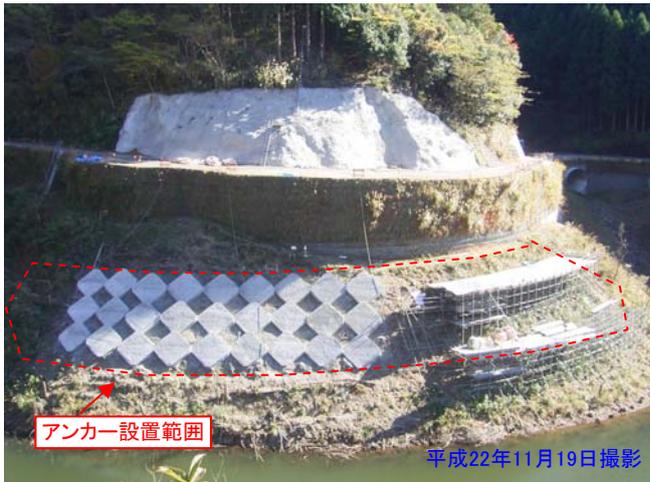

現在は、受圧板の受け台となる台座の施工中です。アンカーはこの台座に受圧板を設置して施工する予定です。写真の台座は全体設置基数の半分程度が終了しています。

今後の予定

付替林道の供用開始に向け、工事の進捗をはかります。また、アンカー工事完了まで変位観測を継続し、安全性を確認したうえで杉沢左岸林道を一般開放する予定です。開放後は散策路として歩行者及び自転車のみ通行ができます。バイク、自動車の通行はできません。（ただし、林道管理等のために許可された車両は通行可能です）

位置図の赤い点線の区間を、工事完了後に供用開始する予定です。現在は、青い線の区間を散策できます。なお、管理所エリア（青い点線）の通行は、午前10時～午後4時までとなります。

位置図



工事の状況、変位観測の状況については、今後も随時お知らせします。
