

道路事業

～産業活動や地域の生活を支援する渋滞対策等の交通円滑化～ 国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)

事業概要

【事業目的】渋滞を解消し安全な迂回ルートを確保するため、新たなバイパスをつくります

国道362号の川根本町元藤川から崎平の区間は、車のすれ違いが困難な道幅の狭い箇所が連続する交通のボトルネックとなっており、特に外部からの車が増加する行楽シーズンなどには長い渋滞が発生するなど、地域交通への支障が生じています。

このため、元藤川から青部地区を経由して崎平に連絡する“青部バイパス”を整備し、渋滞の解消と災害時にも安全な迂回ルートを確保することにより、地域の経済活動と安全・安心な生活を支えます。

当事業では、既に完成した崎平から青部の区間に続き、元藤川から青部の間の1.19kmを整備しています。

【全体計画】

延長 1.19km

事業費 3,400百万円

車線数 2車線

幅員 10.25m

事業期間 平成16年度～平成20年代後期(予定)

【施工中の事業内容】

- ・(仮称)青部トンネル詳細設計
- ・樋門工(普通河川の付替え)

【平成27年度の事業予定】

- ・本線道路工 L=80m
- ・(仮称)青部トンネル掘削工 L=324m

位置図



出典: 静岡県地理情報システム

【お問合せ先】 静岡県島田土木事務所 川根支所
電話: 0547-53-3133

平成29年2月28日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



上空からの状況写真です。
中部電力鉄塔の下をトンネルが通過します。(H27.3)




トンネル掘削状況です。
324mの内、約200mまで掘り進んでいます。




トンネル起点側（藤沢橋側）
の状況です。
坑口部までの掘削が完了しました。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

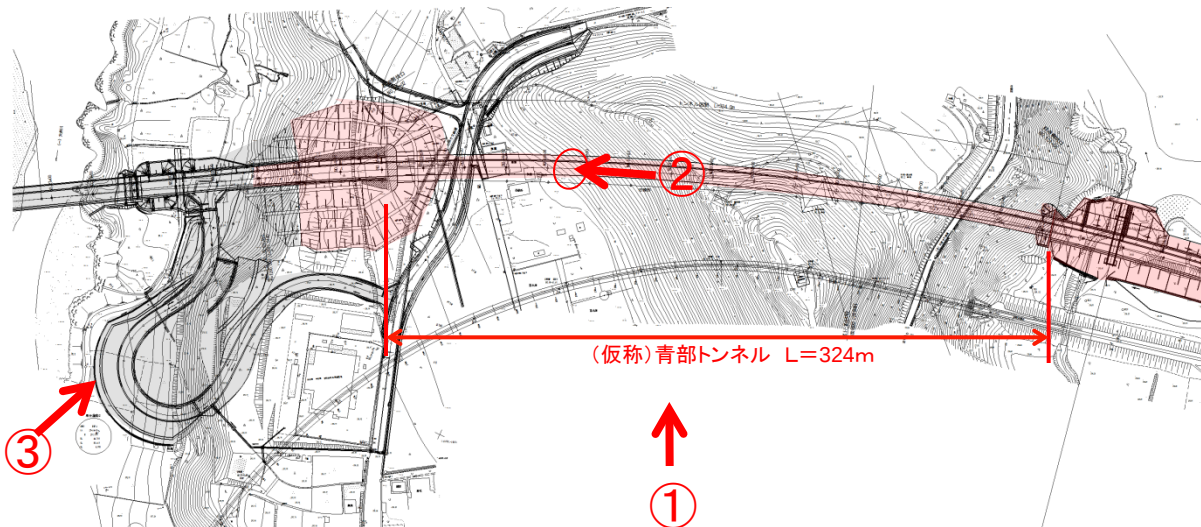

トンネル標準横断面図

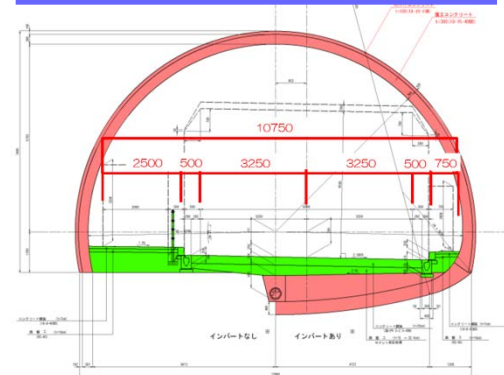

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成28年5月26日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



上空からの状況写真です。
中部電力鉄塔の下をトンネルが通過します。(H27.3)




トンネル終点側(青部駅側)
坑口部の状況です。
掘削に向け、仮設工を進めています。




トンネル起点側(藤沢橋側)
坑口上部の状況です。
引き続き、今後坑口部までの
開削を行います。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

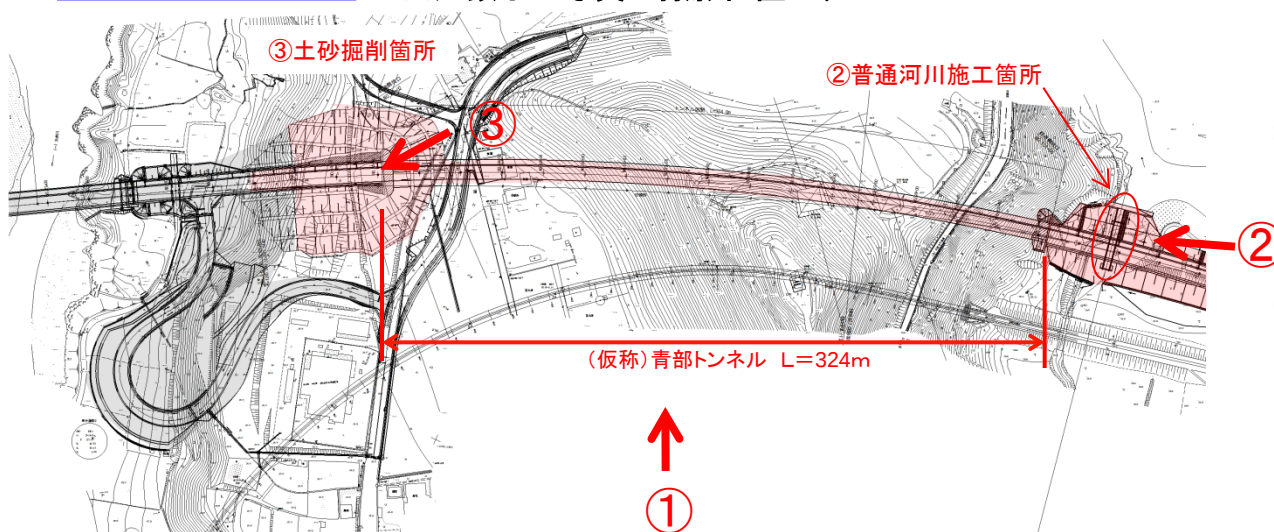

トンネル標準横断面図

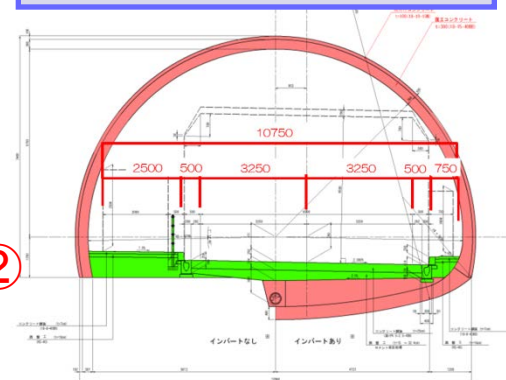

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成28年3月1日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



上空からの状況写真です。
中部電力鉄塔の下をトンネルが通過します。(H27.3)




トンネル終点側（青部駅側）
坑口部の状況です。
坑口部手前の普通河川暗渠化
は完了し、盛土工事を実施し
ています。
盛土工事完了後、トンネル掘
削開始となります。




トンネル起点側（藤沢橋側）
坑口上部の状況です。
引き続き、今後坑口部までの
開削を行います。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

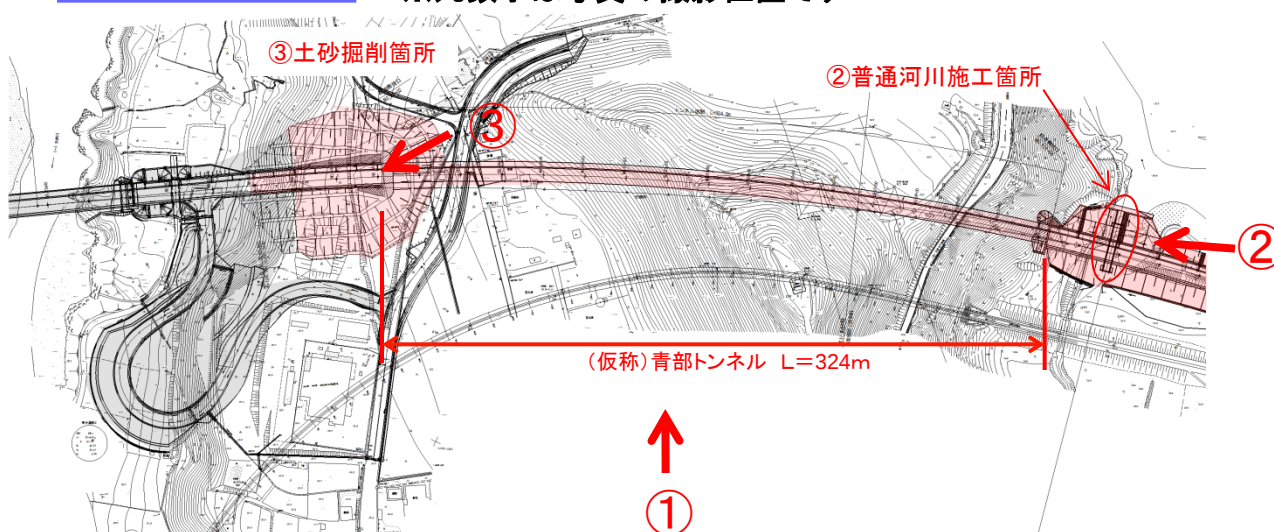

トンネル標準横断面図

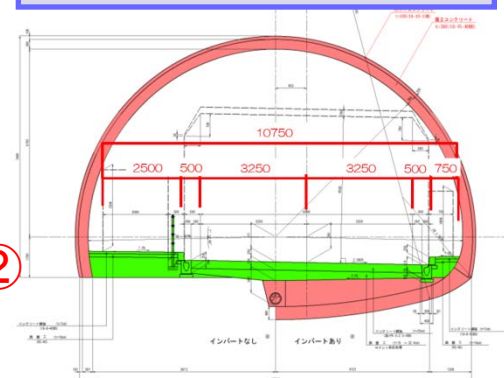

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成27年11月30日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



上空からの状況写真です。中部電力鉄塔の下をトンネルが通過します。




トンネル終点側（青部駅側）坑口部の状況です。
坑口部手前で普通河川の暗渠化を図っています。




（国）362号藤沢橋から先の状況です。この先はトンネルの予定であり、今後坑口部までの開削を行います。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

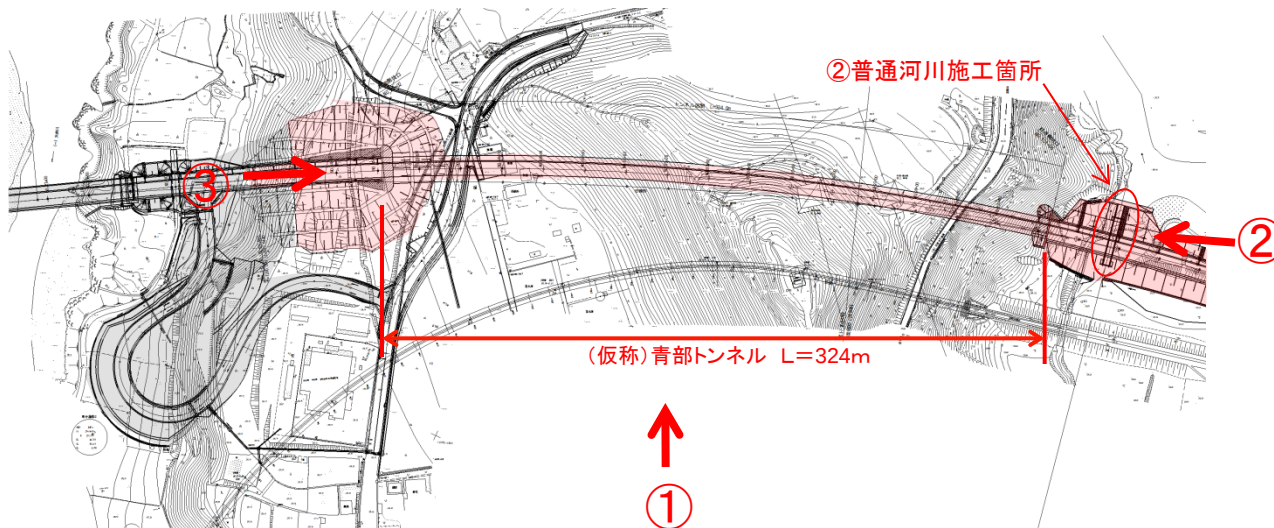

トンネル標準横断面図

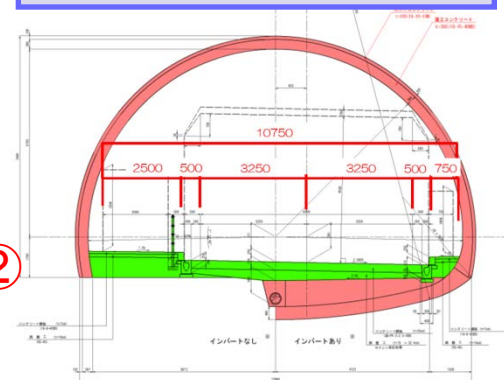

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成27年9月4日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



上空からの状況写真です。中部電力鉄塔の下をトンネルが通過します。




トンネル終点側（青部駅側）坑口部の状況です。
立木の伐採が終わり、今年度末から掘削予定のトンネル工事用の施工ヤードを整備しています。




（国）362号藤沢橋から先の状況です。この先はトンネルの予定となっています。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

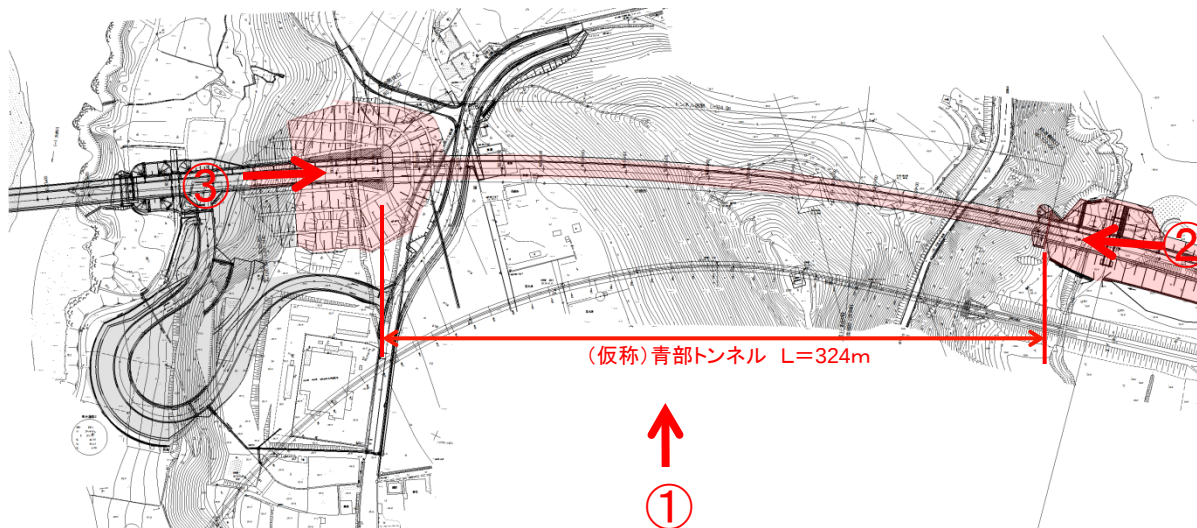

トンネル標準横断面図

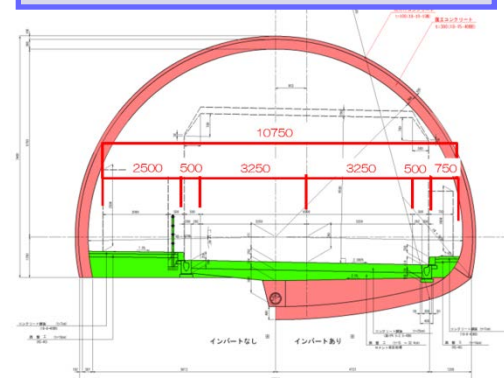

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成27年5月29日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



上空からの状況写真です。中部電力鉄塔の下をトンネルが通過します。




(国) 362号、藤沢橋から先の状況です。この先はトンネルの予定となっています。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です



トンネル標準横断図

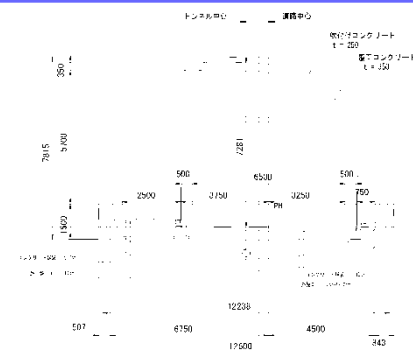

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成27年2月27日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)




上空からの状況写真です。中部電力鉄塔の下をトンネルが通過します。




(国) 362号、藤沢橋から先の状況です。この先はトンネルの予定となっています。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

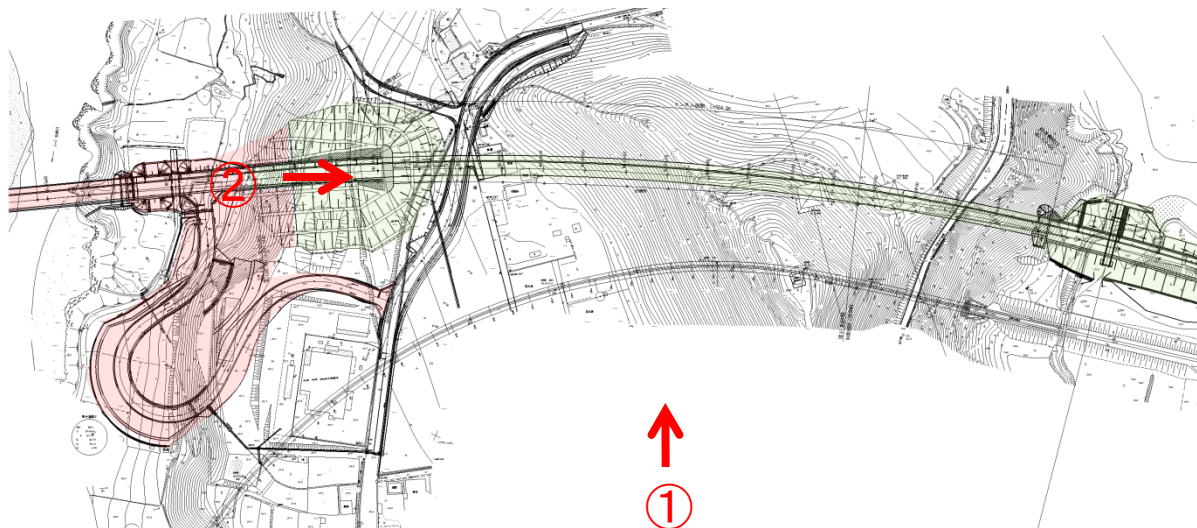

トンネル標準横断面図

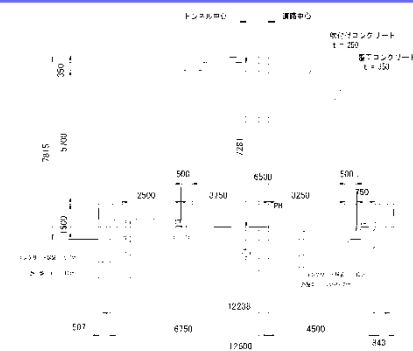

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成26年11月14日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)

平成26年10月21日一部区間開通



(主) 川根寸又峡線から藤沢橋を見た状況です。
歩道からは大井川の景観を楽しめます。




取合道路工の状況です。
走行の際には、勾配が急で、カーブがきついため、安全運転をお願いします。




(国) 362号、藤沢橋から先の状況です。
この先はトンネルの予定となっています。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

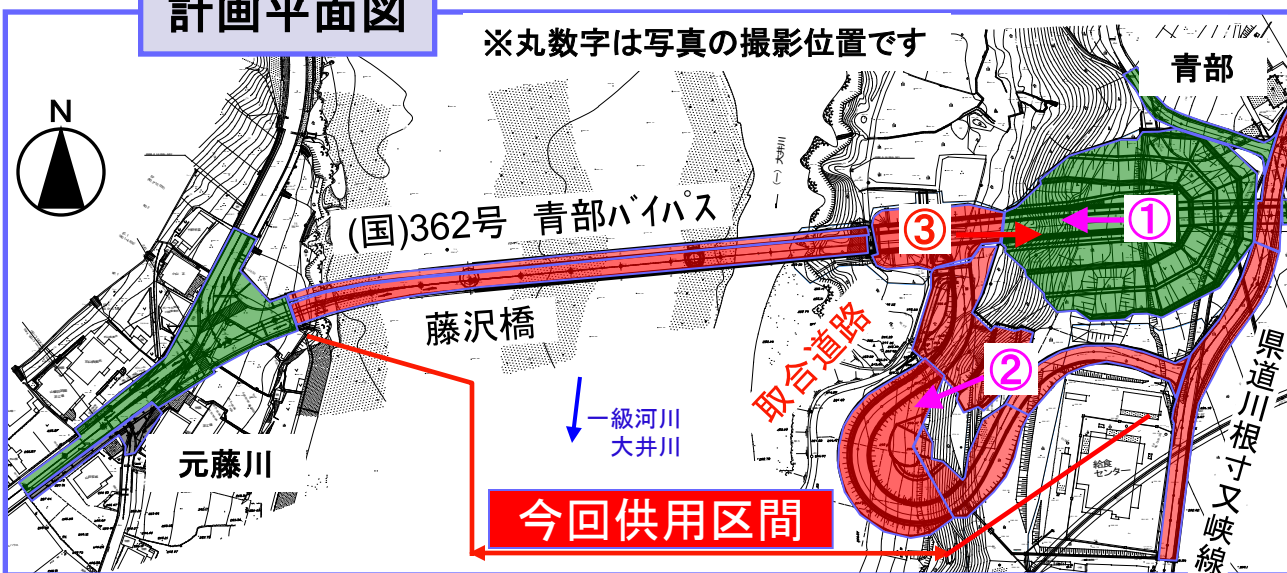

取合道路標準横断図

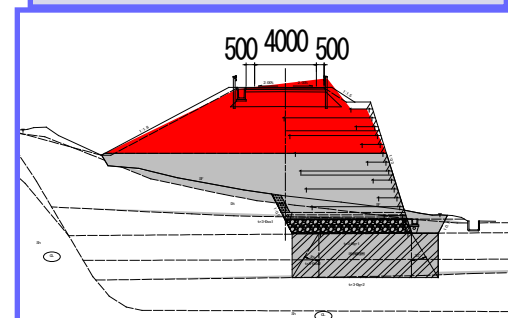

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成26年9月3日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



①
(主) 川根寸又峡線から藤沢橋を見た状況です。本線、橋面の舗装工を実施する予定です。




②
取合道路工の様子です。盛土、側溝工完成後、舗装工事を実施しました。今後、ガードレール等安全施設を設置します。




③
(国) 362号、元藤川側から給食センターを見たところ。取合い道路の法面が完成しています。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

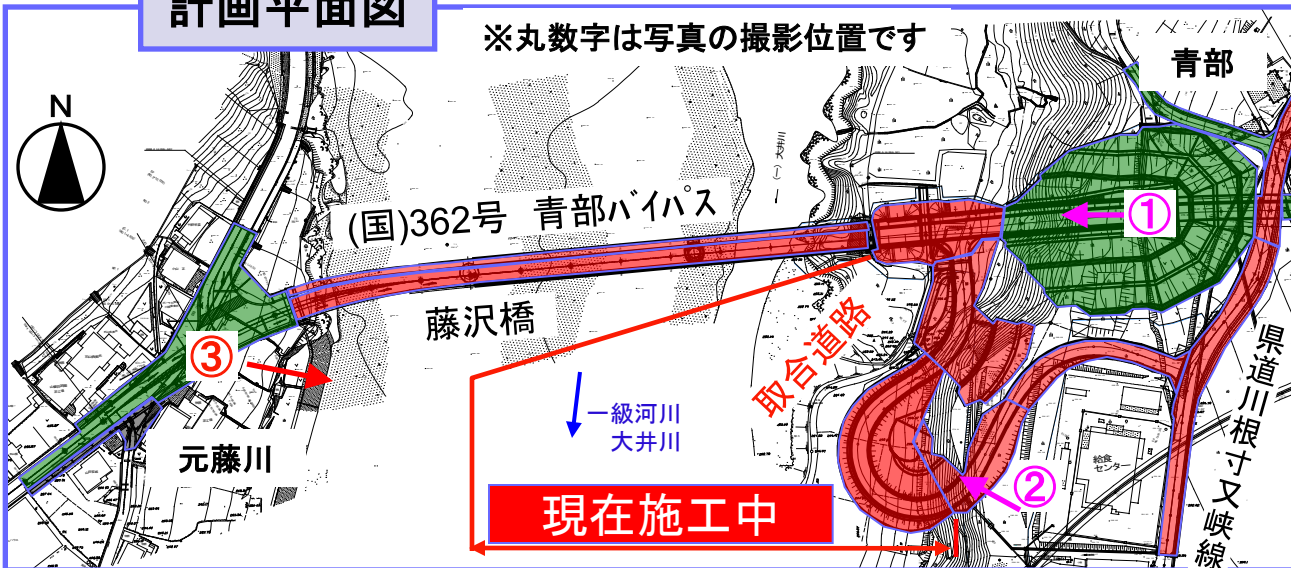

取合道路標準横断図

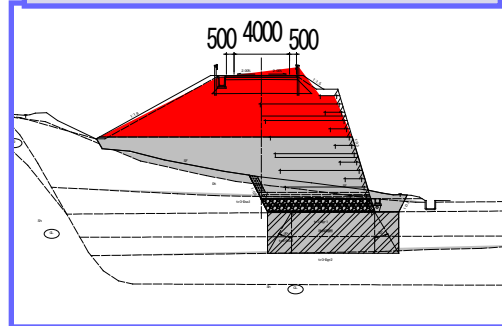

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成26年5月21日

国道362号 青部バイパス 防災・安全交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



(主) 川根寸又峡線から藤沢橋を見た状況です。取合道路工完了後、橋面の舗装工を実施する予定です。




補強土壁、前面の様子です。補強土壁は完成し、上部に路体盛土の様子が見ることができます。




取合道路の路体盛土をしております。盛土工事後、水路やガードレールの設置、アスファルト舗装を実施します。

※丸数字は写真の撮影位置です

計画平面図

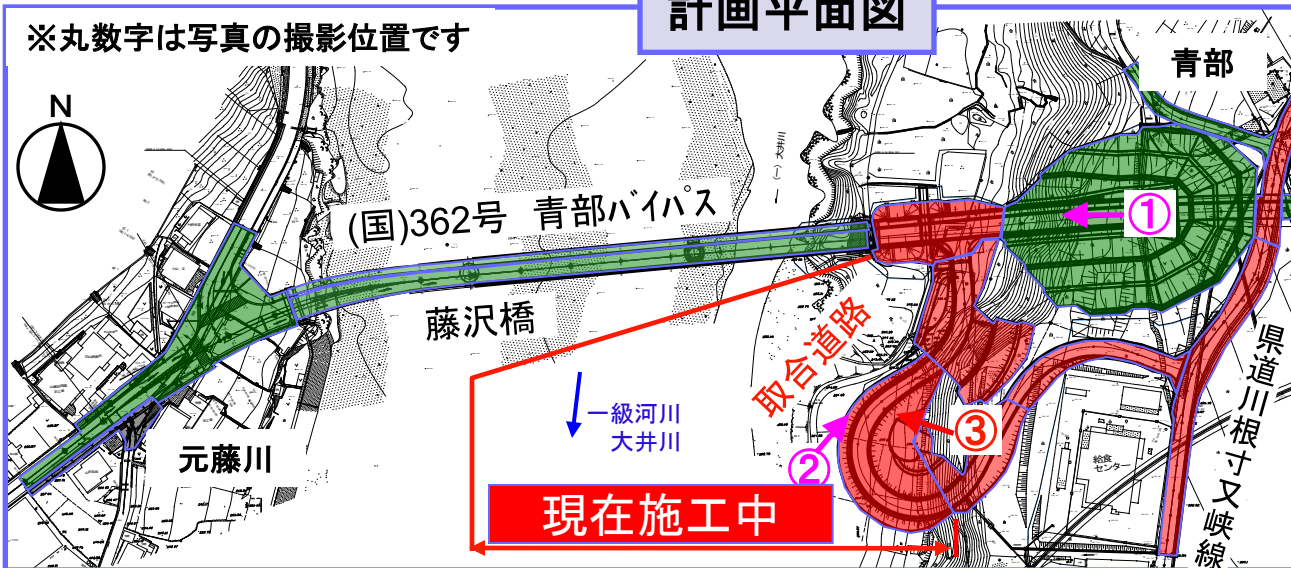

取合道路標準横断面図

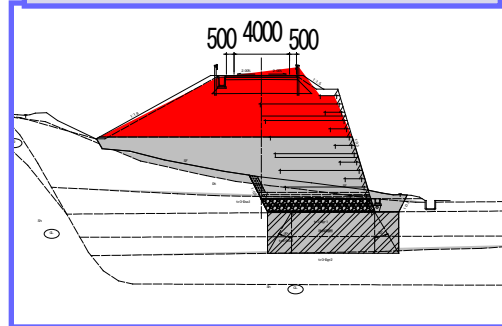

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成25年6月6日

国道362号 青部バイパス 社会資本整備総合交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



盛土工が本格的に始まりました。




補強土壁、前面の様子です。




青部バイパスの掘削した土砂を盛土工に使うための土砂を搬出しています。

※丸数字は写真の撮影位置です

計画平面図

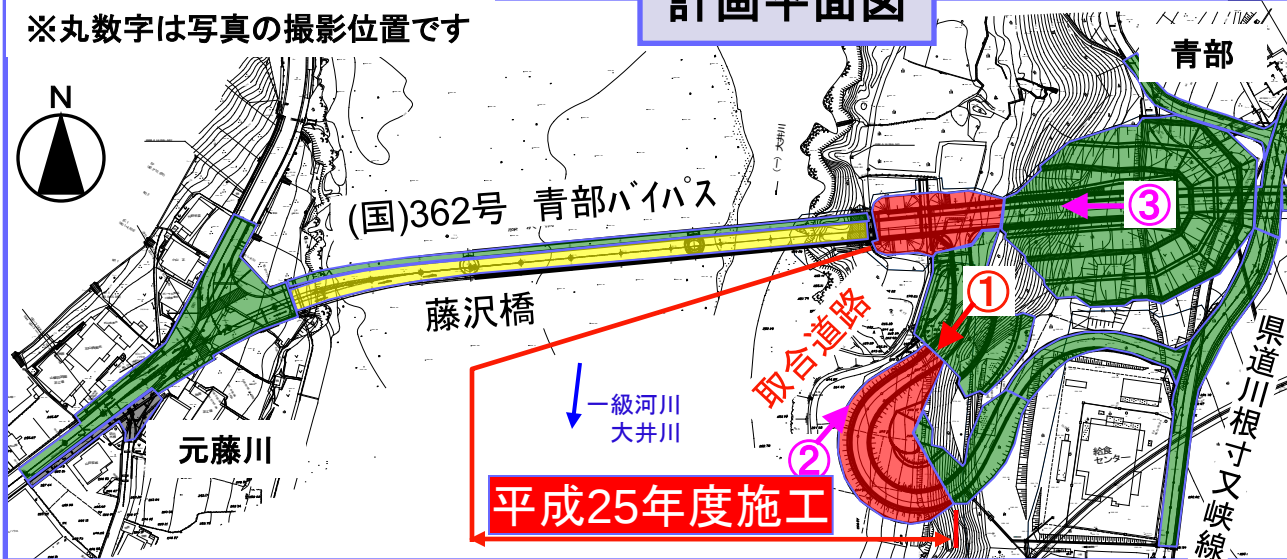



取合道路標準横断面図

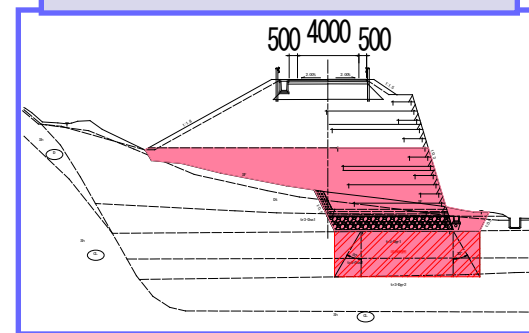

凡 例	
過年度施工済	
今年度施工区間	
来年度以降施工	

平成24年10月30日


国道362号 青部バイパス 社会資本整備総合交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)

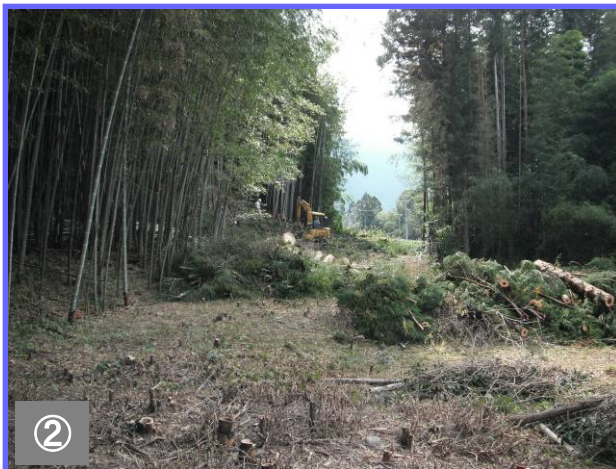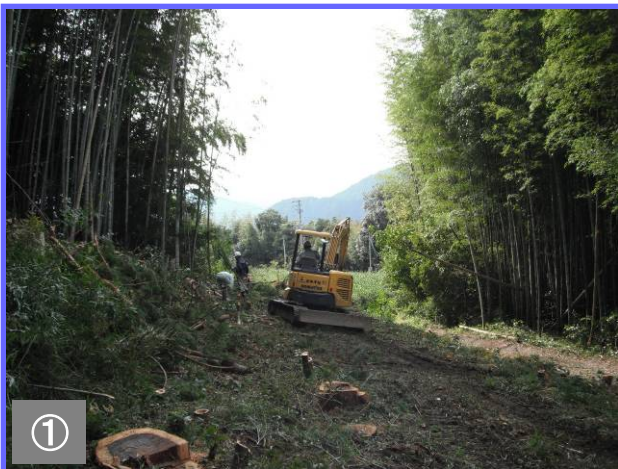


橋の左岸側の工事に着手しました。青部バイパスと県道川根寸又峡線を接続する取合道路の工事です。現在は、工事箇所の立木を伐採しています。

計画平面図

※丸数字は写真の撮影位置です

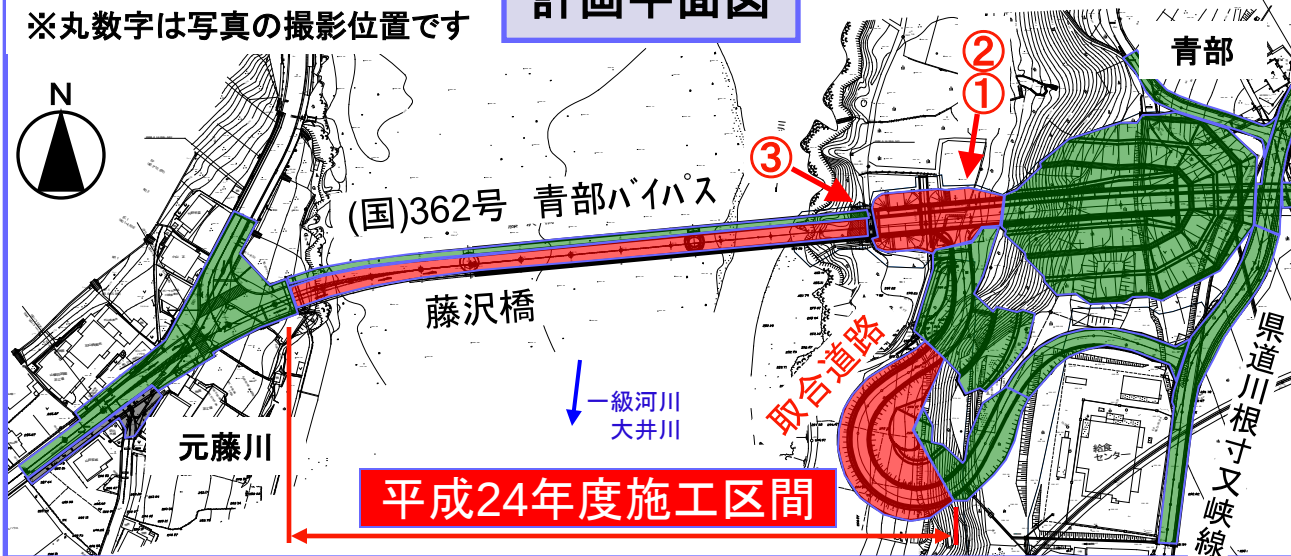


取合道路標準横断面図

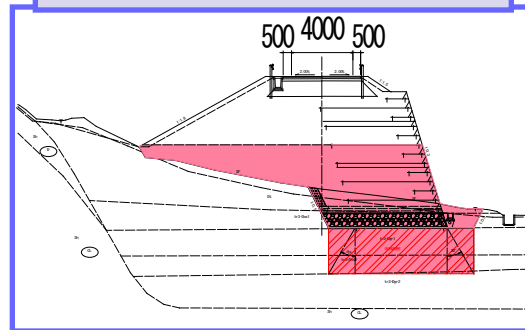

凡 例	
過年度施工済	黒色
今年度施工区間	赤色
来年度以降施工	緑色

平成24年6月29日


国道362号 青部バイパス 社会資本整備総合交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)

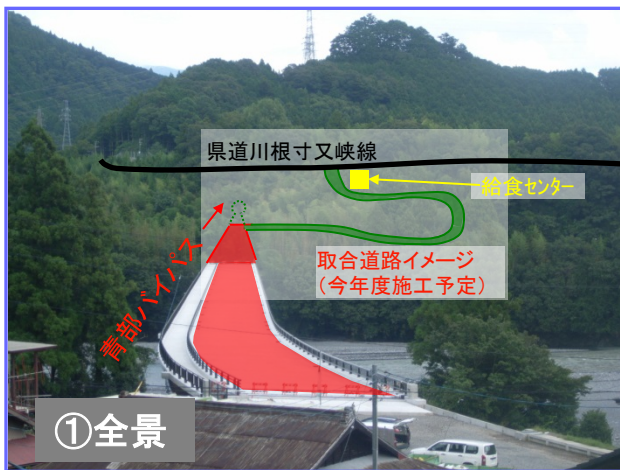


平成24年度は、青部バイパスと県道を接続する取合道路の整備を進めます。
まずは昨年度完成した橋を舗装し、工事車両が通行できるようにしていきます。

※丸数字は写真の撮影位置です

計画平面図

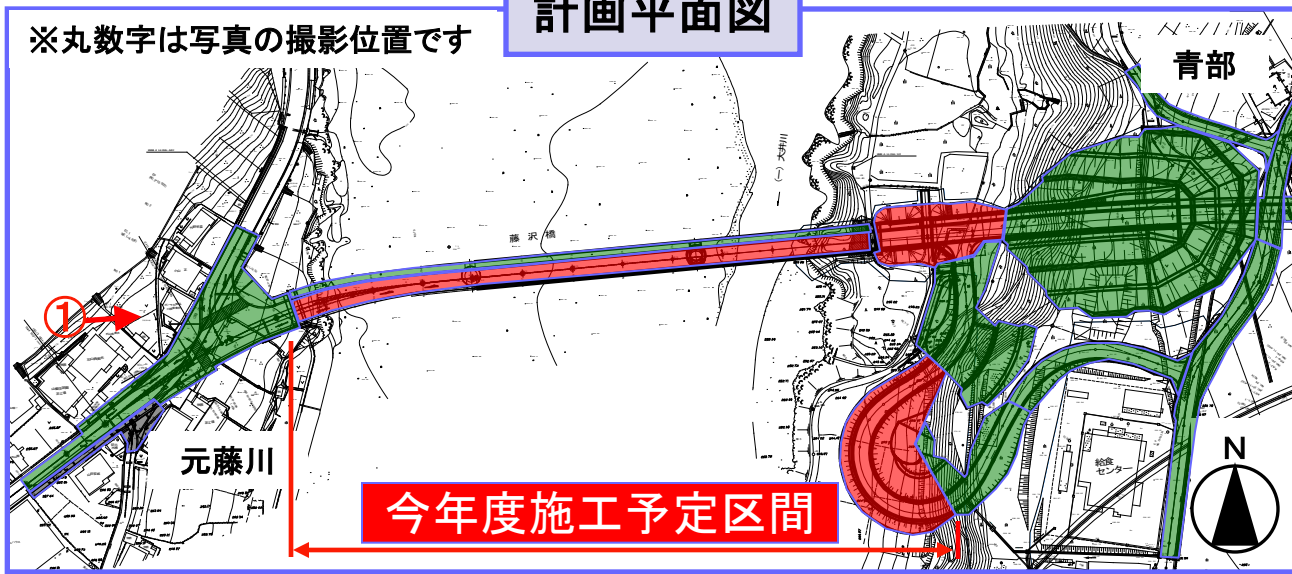

標準横断図

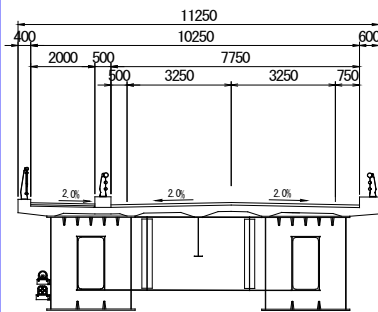

凡 例

過年度施工済	
今年度施工区間	
来年度以降施工	

平成23年8月24日

国道362号 青部バイパス 社会資本整備総合交付金事業 (榛原郡川根本町元藤川～青部)



①全景

元藤川から青部に向かって大井川を渡る新しい橋が架かりました。
橋を通行できるのは、青部側の道路の整備後となります。




②


元藤川側の橋台付近の状況です。橋台背面(写真手前側の部分)は、埋め戻した土砂の上をコンクリートで補強してあります。

※丸数字は写真の撮影位置です

計画平面図

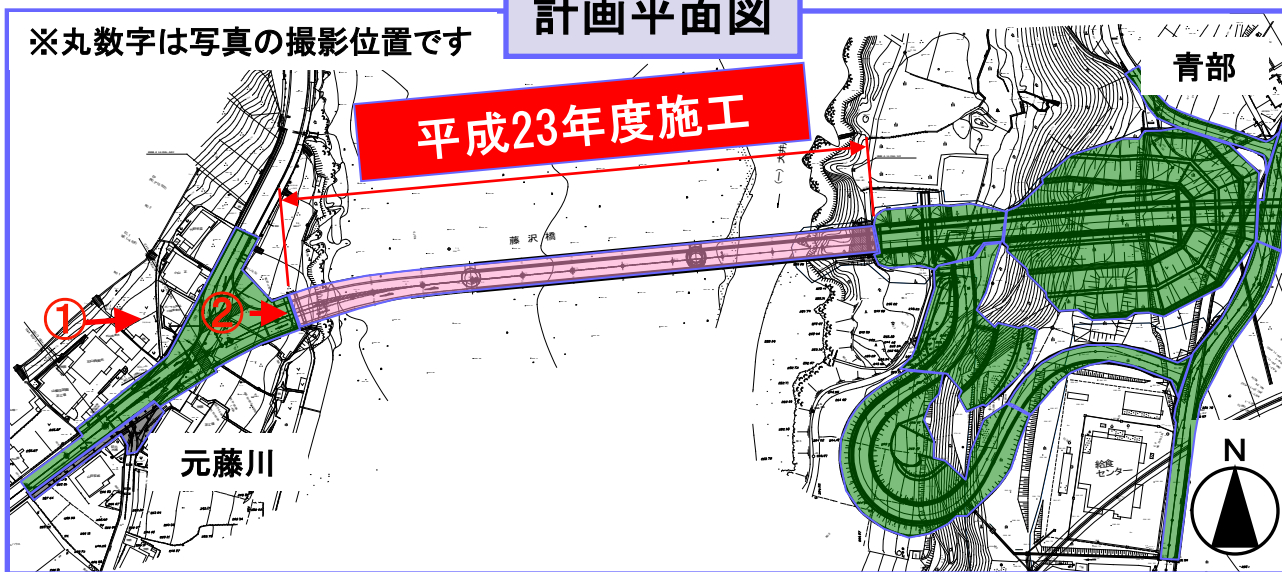

標準横断図

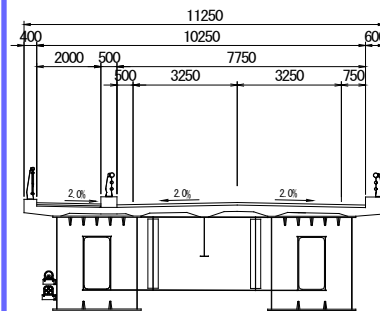

凡 例

過年度施工済	
今年度施工区間	
来年度以降施工	
