

# 平成 29 年度 台風 21、22 号による濁度状況

平成 30 年 3 月 27 日 (火)


静岡県袋井土木事務所

＜ダム下流河川の濁度調査期間＞

平成 29 年 10 月 24 日(火)～平成 30 年 1 月 26 日(金)


毎日 1 回 5 地点の濁度計測

## 平面図

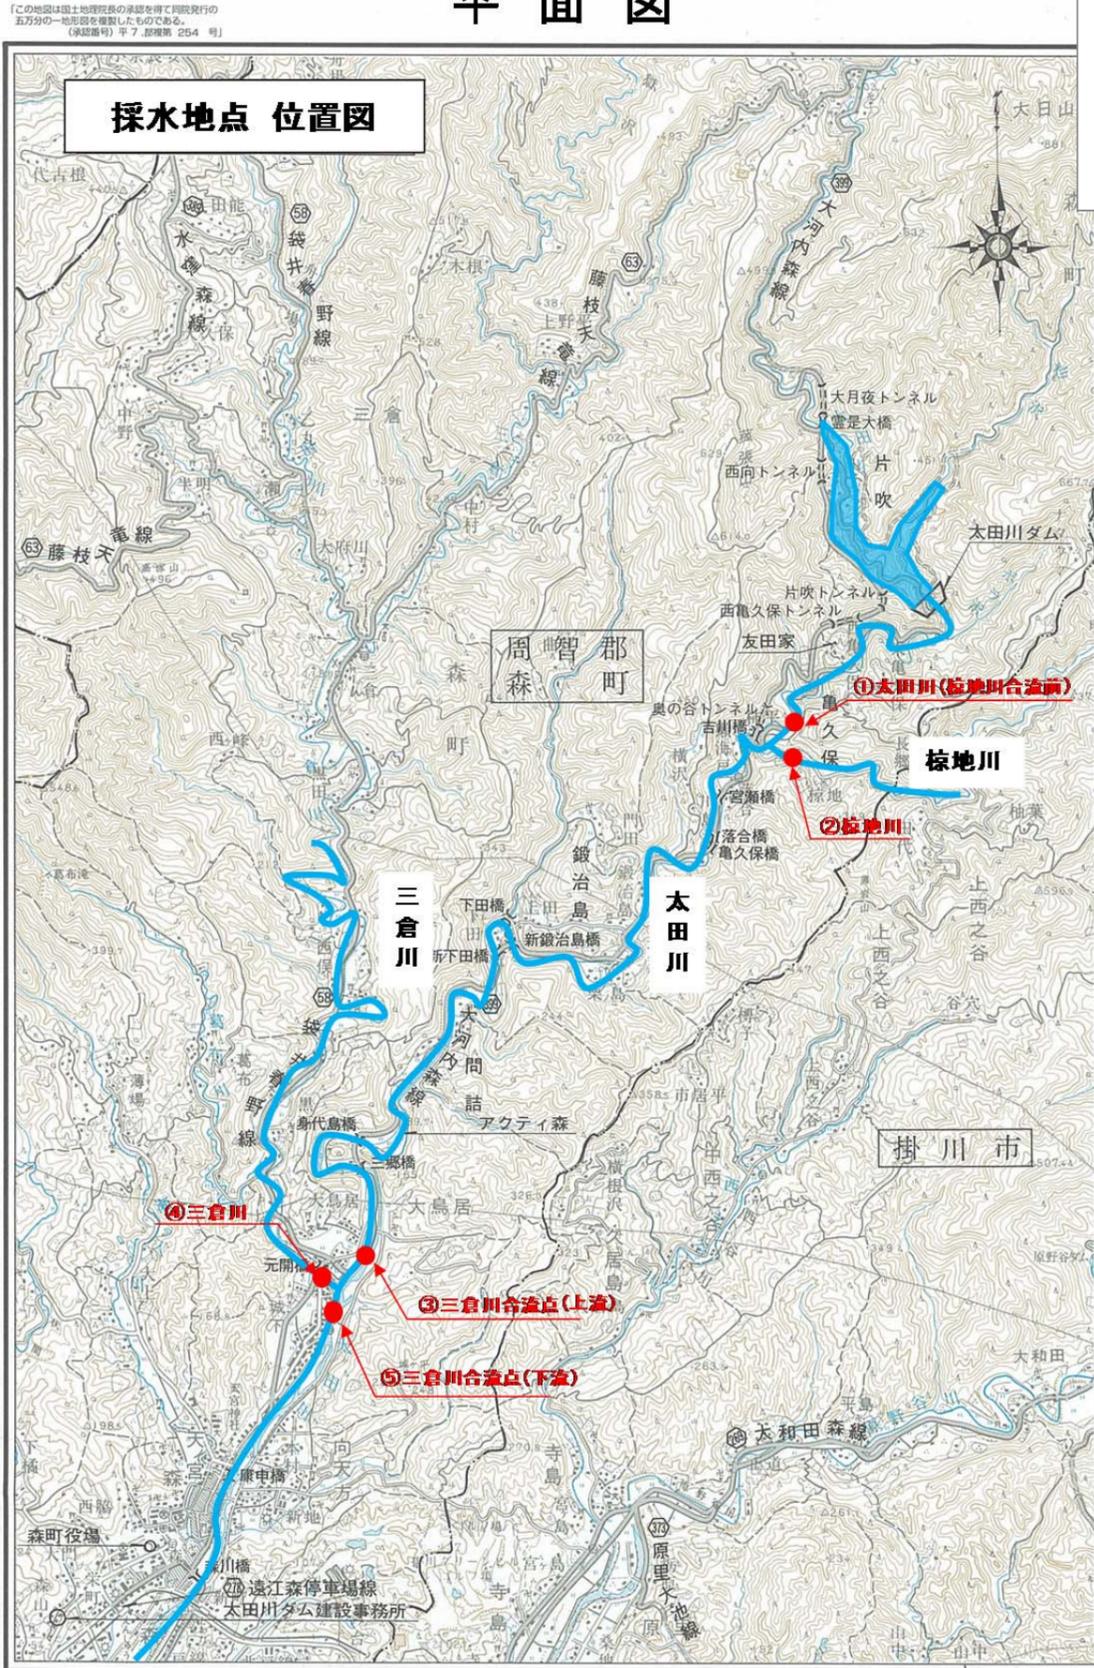






静岡県太田川ダム建設事務所

## 日雨量

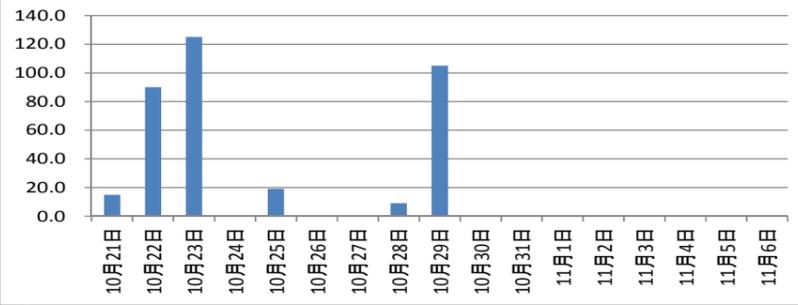

※10/30～1/26 100mm/日の降雨はなかった

## 【濁度】

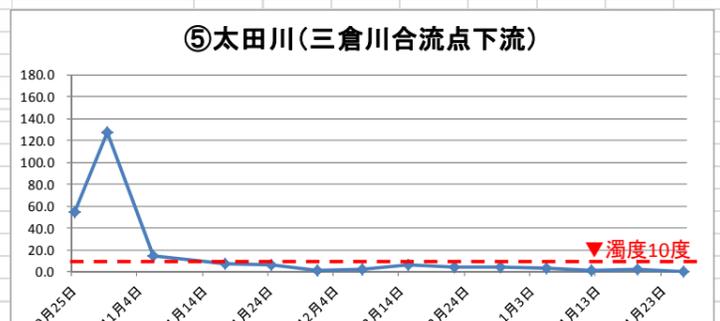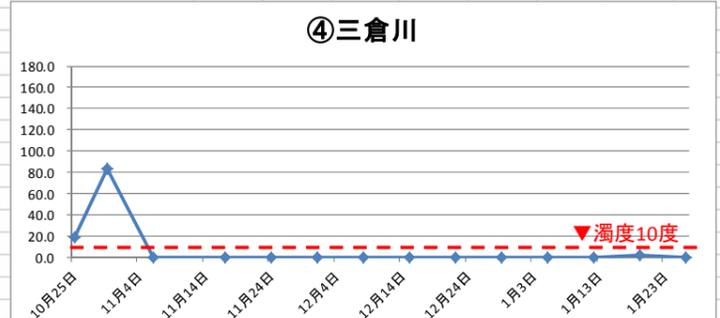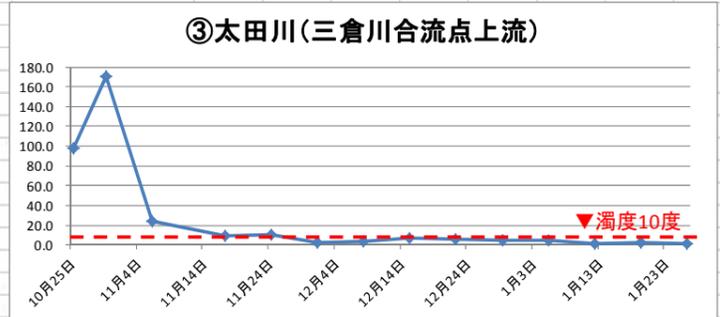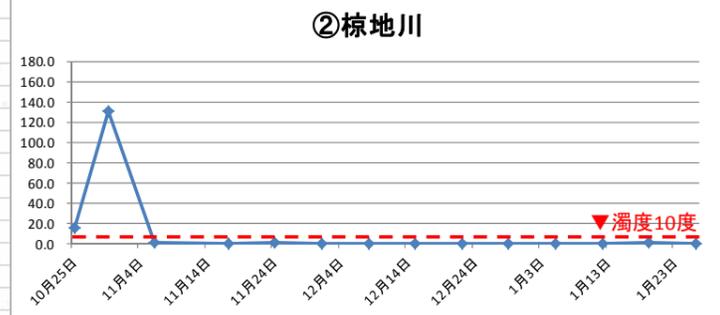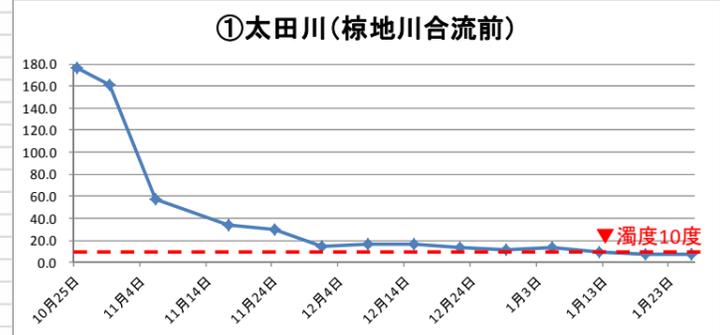

濁度	10月25日	10月30日	11月6日	11月17日	11月24日	12月1日	12月8日	12月15日	12月22日	12月29日	1月5日	1月12日	1月19日	1月26日
	1日目	6日目	13日目	24日間	31日間	38日間	45日間	52日間	59日間	66日間	73日間	80日間	87日間	94日間
①太田川(棕地川合流前)	176.0	161.0	57.1	34.1	29.3	14.7	16.1	16.6	13.4	11.5	12.9	9.4	7.4	7.7
②棕地川	16.2	131.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
③太田川(三倉川合流点上流)	98.0	170.0	24.3	9.0	10.8	2.6	3.9	7.5	5.8	4.4	4.4	1.7	2.6	1.4
④三倉川	19.1	83.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.9	0.2
⑤太田川(三倉川合流点下流)	54.7	127.0	15.0	7.1	6.6	0.7	2.1	6.4	4.7	4.2	3.5	1.1	2.3	0.0
